
Bijlage 1. Maatwerk maatregelen per boomgroeiplaats

In deze bijlage zijn de maatregelen per boom nader gespecificeerd. Op afbeelding 1. zijn de boompunten met nummer aangegeven. Op afbeelding 2. is te zien waar demontabele hekwerken komen te staan en welke zones bij de indeling van evenementen vrij moeten blijven. Op afbeelding 3. Is de meest recente indeling van de kasteelfeesten weergeven.



Afbeelding 1. Solitaire bomen en boomgroepen in de kasteeltuin met boomnummer en kleur op basis van conditie.

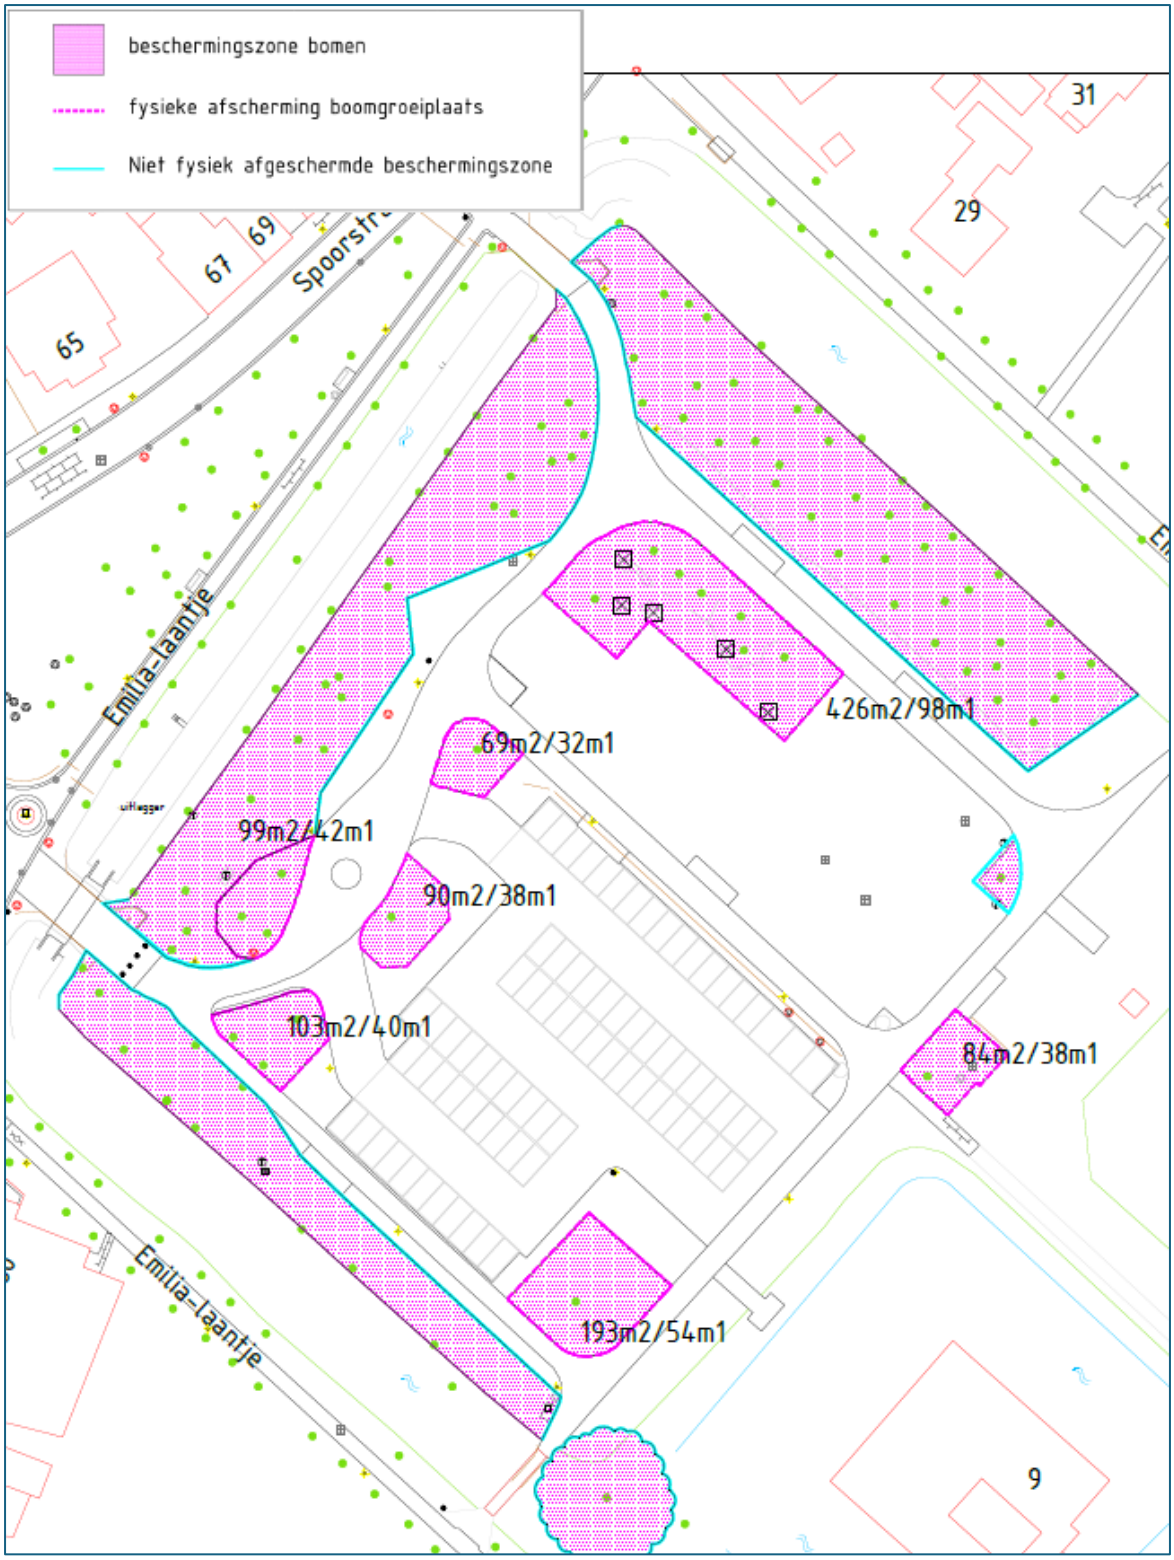

Afbeelding 2. Toekomstige hekwerken en beschermingszones oppervlaktes gearceerd.

Algemeen: Rondom de bomen met nummer 1, 2, 4 t/m 10, 13 t/m 16 en 20 t/m 22 wordt een demontabel hekwerk geplaatst (zie afbeelding 1.2). Tijdens de opbouw van de kasteelfeesten en de kasteelfeesten zelf wordt deze bescherming tijdelijk verwijderd bij de bomen 3, 13, 14 en 20 t/m 22, waarvoor dan alternatieve maatregelen in de plaats komen.

Maatwerk maatregelen per boom(groep)

Boom 20, 21, 22:

Knelpunt: Route vrachtwagens tussen bomen door

Oplossingen:

- Hekwerken verwijderen tijdens opbouw van kasteelfeesten;
- Inzet van grondzuiger om vrije ruimtes te creëren op plekken waar geen essentiële beworteling aanwezig is;
- Vaste schroefpalen plaatsen;
- Voorafgaand aan de opbouw van de kasteelfeesten wordt hierop een dek geplaats zodat vrachtwagens hier overheen kunnen rijden;
- Na afloop van de kasteelfeesten de schroefpalen afdekken;
- Het dek verwijderen;
- Hekwerken terugplaatsen.

Boom 16, 17, 18:

Knelpunt: Geen, met de nieuwe indeling is er voldoende ruimte.

Oplossingen: Met hekwerken groeiplaats afschermen tijdens alle evenementen.

Boom 14:

Knelpunt: De hoofdtent staat binnen enkele meters van de stam en de deur van de bevoorrading zit ter hoogte van de boom.

Oplossingen:

- Inzet van een grondzuiger om vrije ruimtes te creëren op plekken waar geen essentiële beworteling aanwezig is;
- Drie funderingspalen plaatsen als vaste steunpunten voor de hoofdtent;
- De hekwerken jaarlijks tijdens de opbouw voor de helft verwijderen aan de tentzijde;
- De steunpunten van de tent op de funderingspalen plaatsen;
- Bevoorrading verplaatsen;
- Na afloop van de kasteelfeesten de gaten van de funderingspalen afdekken;
- Hekwerken terugplaatsen.

Boom 13:

Knelpunt: Er loopt een vluchtroute langs de boom.

Oplossingen:

- Hekwerk na opbouw verwijderen;
- Geotextiel, zand en rijplaten toepassen tijdens evenement om druk op de groeiplaats te verdelen.

Boom 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:

Knelpunt: Geen, met de nieuwe indeling is er voldoende ruimte.


Oplossingen: Met hekwerken de groeiplaats afschermen tijdens alle evenementen.

Boom 2:

Knelpunt: Het kassahokje komt binnen de beschermingszone van de boom te staan.

Oplossingen:

- Het hekwerk voorafgaand aan opbouw verwijderen;
- De aanrijdroute van de heftruck fysiek vastleggen;
- Het plaatsen van geotextiel, een zandlaag en een rijplaat voorafgaand aan het plaatsen van het kassahokje;
- Deze beschermingsmaatregelen na afloop van het evenement verwijderen;
- De hekwerken terugplaatsen.

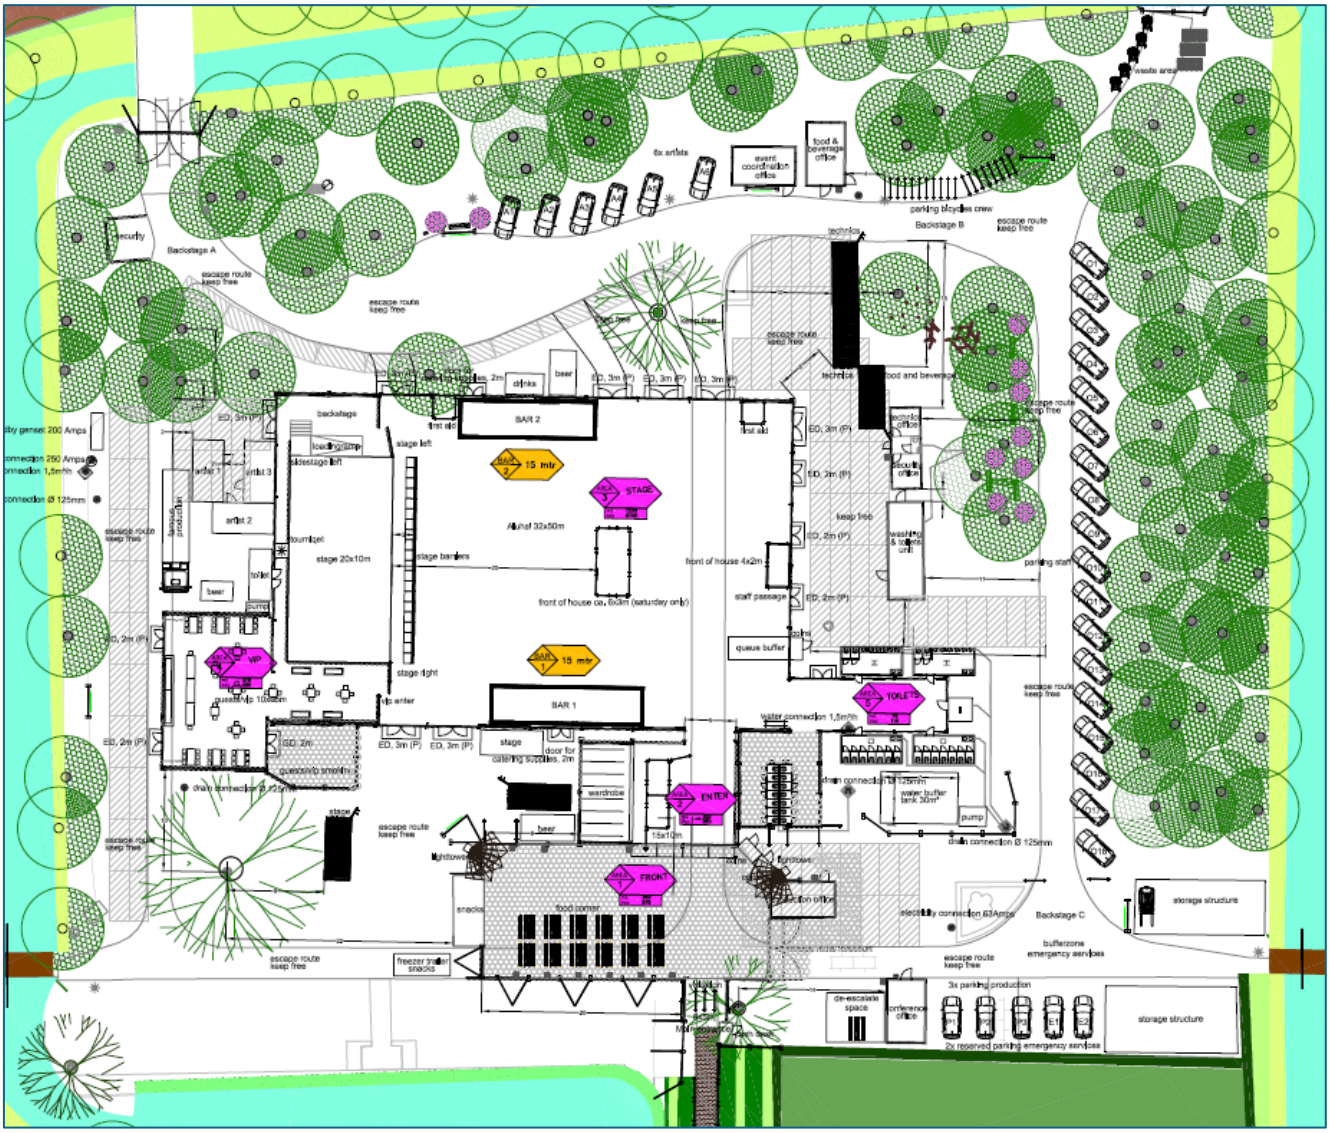

Afbeelding 3. Indeling kasteelfeesten 2026 in relatie tot bomen.
